IMPERMEABILIZACIÓN PLAZA

AZORALLOM, SL.

Project Management: FACILITEM SOLUCIONES
Inicio Obra: 22/04/2014
Día Actual 26/05/2014

WBS	Zonas / Tareas	Inicio	Final	Días Trabajo	% Realizado	Días Naturales	Días Realizados	Días Remanentes
1	ZONA 1	22/04/2014	22/05/2014	22	82%	31	24	7
1.1	Demolición	22/04/2014	25/04/2014	4	100%	4	4	0
1.2	Fresado	26/04/2014	02/05/2014	4	100%	7	6	1
1.3	Hormigonado	08/05/2014	08/05/2014	1	100%	1	1	0
1.4	Impermeabilización	15/05/2014	15/05/2014	1	100%	1	1	0
1.5	Pavimento	16/05/2014	22/05/2014	5	45%	7	4	3
2	ZONA 2	30/04/2014	02/06/2014	22	62%	34	20	14
2.1	Demolición	30/04/2014	05/05/2014	3	100%	6	6	0
2.2	Fresado	04/05/2014	08/05/2014	4	100%	5	4	1
2.3	Hormigonado	22/05/2014	22/05/2014	1	100%	1	1	0
2.4	Impermeabilización	26/05/2014	26/05/2014	1	0%	1	0	1
2.5	Pavimento	28/05/2014	02/06/2014	4	0%	6	0	6
3	ZONA 3	30/04/2014	02/06/2014	22	59%	34	19	15
3.1	Demolición	30/04/2014	05/05/2014	3	100%	6	6	0
3.2	Fresado	05/05/2014	08/05/2014	4	100%	4	4	0
3.3	Hormigonado	08/05/2014	12/05/2014	3	100%	5	5	0
3.4	Impermeabilización	20/05/2014	20/05/2014	1	0%	1	0	1
3.5	Pavimento	26/05/2014	02/06/2014	6	0%	8	0	8
4	ZONA 4	30/04/2014	23/05/2014	17	74%	24	19	5
4.1	Demolición	30/04/2014	05/05/2014	3	100%	6	6	0
4.2	Fresado	05/05/2014	08/05/2014	4	100%	4	4	0
4.3	Hormigonado	08/05/2014	12/05/2014	3	100%	5	5	0
4.4	Impermeabilización	20/05/2014	20/05/2014	1	35%	1	0	1
4.5	Pavimento	21/05/2014	23/05/2014	3	0%	3	0	3
5	ZONA 5	05/05/2014	28/05/2014	17	66%	24	15	9
5.1	Demolición	05/05/2014	09/05/2014	5	80%	5	4	1
5.2	Fresado	08/05/2014	12/05/2014	3	100%	5	5	0
5.3	Hormigonado	12/05/2014	12/05/2014	1	80%	1	0	1
5.4	Impermeabilización	19/05/2014	19/05/2014	1	80%	1	0	1
5.5	Pavimento	23/05/2014	28/05/2014	3	0%	6	0	6
6	ZONA 6	30/04/2014	27/05/2014	18	55%	28	14	14
6.1	Demolición	30/04/2014	05/05/2014	3	100%	6	6	0
6.2	Fresado	09/05/2014	09/05/2014	1	100%	1	1	0
6.3	Hormigonado	12/05/2014	12/05/2014	1	100%	1	1	0
6.4	Impermeabilización	19/05/2014	19/05/2014	1	100%	1	1	0
6.5	Pavimento	20/05/2014	27/05/2014	5	0%	8	0	8
7	ZONA 7	05/05/2014	29/05/2014	18	78%	25	18	7
7.1	Demolición	05/05/2014	09/05/2014	5	100%	5	5	0
7.2	Fresado	08/05/2014	12/05/2014	3	100%	5	5	0
7.3	Hormigonado	15/05/2014	15/05/2014	1	100%	1	1	0
7.4	Impermeabilización	22/05/2014	27/05/2014	3	50%	6	1	5
7.5	Pavimento	27/05/2014	29/05/2014	3	40%	3	1	2
8	ZONA 8	08/05/2014	30/05/2014	16	54%	23	12	11
8.1	Demolición	08/05/2014	13/05/2014	4	100%	6	6	0
8.2	Fresado	15/05/2014	16/05/2014	2	100%	2	2	0
8.3	Hormigonado	16/05/2014	16/05/2014	1	100%	1	1	0
8.4	Impermeabilización	22/05/2014	22/05/2014	1	0%	1	0	1
8.5	Pavimento	26/05/2014	30/05/2014	5	0%	5	0	5
9	ZONA 9	16/05/2014	22/05/2014	5	0%	7	0	7
9.1	Demolición	16/05/2014	19/05/2014	2	0%	4	0	4
9.2	Hormigonado	19/05/2014	19/05/2014	1	0%	1	0	1
9.3	Pavimento	20/05/2014	22/05/2014	3	0%	3	0	3
10	ZONA 10	15/05/2014	03/06/2014	13	66%	20	13	7
10.1	Demolición	15/05/2014	16/05/2014	2	100%	2	2	0
10.2	Fresado	16/05/2014	16/05/2014	1	100%	1	1	0
10.3	Hormigonado	19/05/2014	21/05/2014	3	100%	3	3	0
10.4	Impermeabilización	28/05/2014	28/05/2014	1	60%	1	0	1
10.5	Pavimento	30/05/2014	03/06/2014	3	0%	5	0	5
11	ZONA 11	15/05/2014	23/05/2014	7	0%	9	0	9
11.1	Demolición	15/05/2014	16/05/2014	2	0%	2	0	2
11.2	Hormigonado	16/05/2014	16/05/2014	1	0%	1	0	1
11.3	Pavimento	21/05/2014	23/05/2014	3	0%	3	0	3
12	ZONA 12	13/05/2014	23/05/2014	9	97%	11	10	1
12.1	Demolición	13/05/2014	13/05/2014	1	100%	1	1	0
12.2	Fresado	14/05/2014	15/05/2014	2	100%	2	2	0
12.3	Hormigonado	15/05/2014	15/05/2014	1	100%	1	1	0
12.4	Impermeabilización	21/05/2014	23/05/2014	3	100%	3	3	0
12.5	Pavimento	21/05/2014	23/05/2014	3	90%	3	2	1
13	ZONA 13	20/05/2014	03/06/2014	10	35%	15	3	12
13.1	Demolición	20/05/2014	20/05/2014	1	100%	1	1	0
13.2	Fresado	21/05/2014	21/05/2014	1	90%	1	0	1
13.3	Hormigonado	22/05/2014	22/05/2014	1	90%	1	0	1
13.4	Impermeabilización	28/05/2014	29/05/2014	2	0%	2	0	2
13.5	Pavimento	30/05/2014	03/06/2014	3	0%	5	0	5
14	ZONA 14	14/05/2014	06/06/2014	17	15%	24	2	22
14.1	Demolición	14/05/2014	15/05/2014	2	60%	2	1	1
14.2	Formación rampas escaleras	17/05/2014	19/05/2014	1	25%	3	0	3
14.3	Hormigonado	19/05/2014	19/05/2014	1	0%	1	0	1
14.4	Impermeabilización	28/05/2014	29/05/2014	2	0%	2	0	2
14.5	Pavimento	03/06/2014	06/06/2014	4	0%	4	0	4
15	ZONA 15	14/05/2014	06/06/2014	17	55%	24	14	10
15.1	Demolición	14/05/2014	15/05/2014	2	100%	2	2	0
15.2	Fresado	17/05/2014	19/05/2014	1	100%	3	2	1
15.3	Hormigonado	17/05/2014	21/05/2014	3	100%	5	4	1
15.4	Impermeabilización	22/05/2014	22/05/2014	1	0%	1	0	1
15.5	Pavimento	03/06/2014	06/06/2014	4	0%	4	0	4
16	ZONA 16	16/05/2014	12/06/2014	19	40%	28	12	16
16.1	Demolición	16/05/2014	19/05/2014	2	100%	4	4	0
16.2	Fresado	20/05/2014	20/05/2014	1	100%	1	1	0
16.3	Hormigonado	21/05/2014	21/05/2014	1	100%	1	1	0
16.4	Impermeabilización	26/05/2014	27/05/2014	2	0%	2	0	2
16.5	Pavimento	09/06/2014	12/06/2014	4	0%	4	0	4
17	ZONA 17	19/05/2014	12/06/2014	18	26%	25	4	21
17.1	Demolición	19/05/2014	19/05/2014	1	100%	1	1	0
17.2	Formación rampas escaleras	20/05/2014	23/05/2014	4	45%	4	1	3
17.3	Hormigonado	23/05/2014	23/05/2014	1	60%	1	0	1
17.4	Impermeabilización	27/05/2014	27/05/2014	1	0%	1	0	1
17.5	Pavimento	05/06/2014	12/06/2014	6	0%	8	0	8
18	ZONA 18	20/05/2014	17/06/2014	20	44%	29	13	16
18.1	Demolición	20/05/2014	21/05/2014	2	100%	2	2	0
18.2	Fresado	21/05/2014	21/05/2014	1	100%	1	1	0
18.3	Hormigonado	22/05/2014	22/05/2014	1	100%	1	1	0
18.4	Impermeabilización	28/05/2014	29/05/2014	2	0%	2	0	2
18.5	Pavimento	13/06/2014	17/06/2014	3	0%	5	0	5
19	ZONA 19	06/05/2014	21/05/2014	12	67%	16	10	6
19.1	Demolición	06/05/2014	08/05/2014	3	100%	3	3	0
19.2	Fresado	08/05/2014	09/05/2014	2	100%	2	2	0
19.3	Hormigonado	12/05/2014	12/05/2014	1	100%	1	1	0
19.4	Impermeabilización	15/05/2014	15/05/2014	1	70%	1	0	1
19.5	Pavimento	19/05/2014	21/05/2014	3	0%	3	0	3
20	ZONA 20	28/04/2014	18/06/2014	36	45%	52	23	29
20.1	Demolición	28/04/2014	29/04/2014	2	100%	2	2	0
20.2	Fresado	14/05/2014	15/05/2014	2	100%	2	2	0
20.3	Hormigonado	15/05/2014	15/05/2014	1	100%	1	1	0
20.4	Impermeabilización	21/05/2014	23/05/2014	3	0%	3	0	3
20.5	Pavimento	16/06/2014	18/06/2014	3	0%	3	0	3

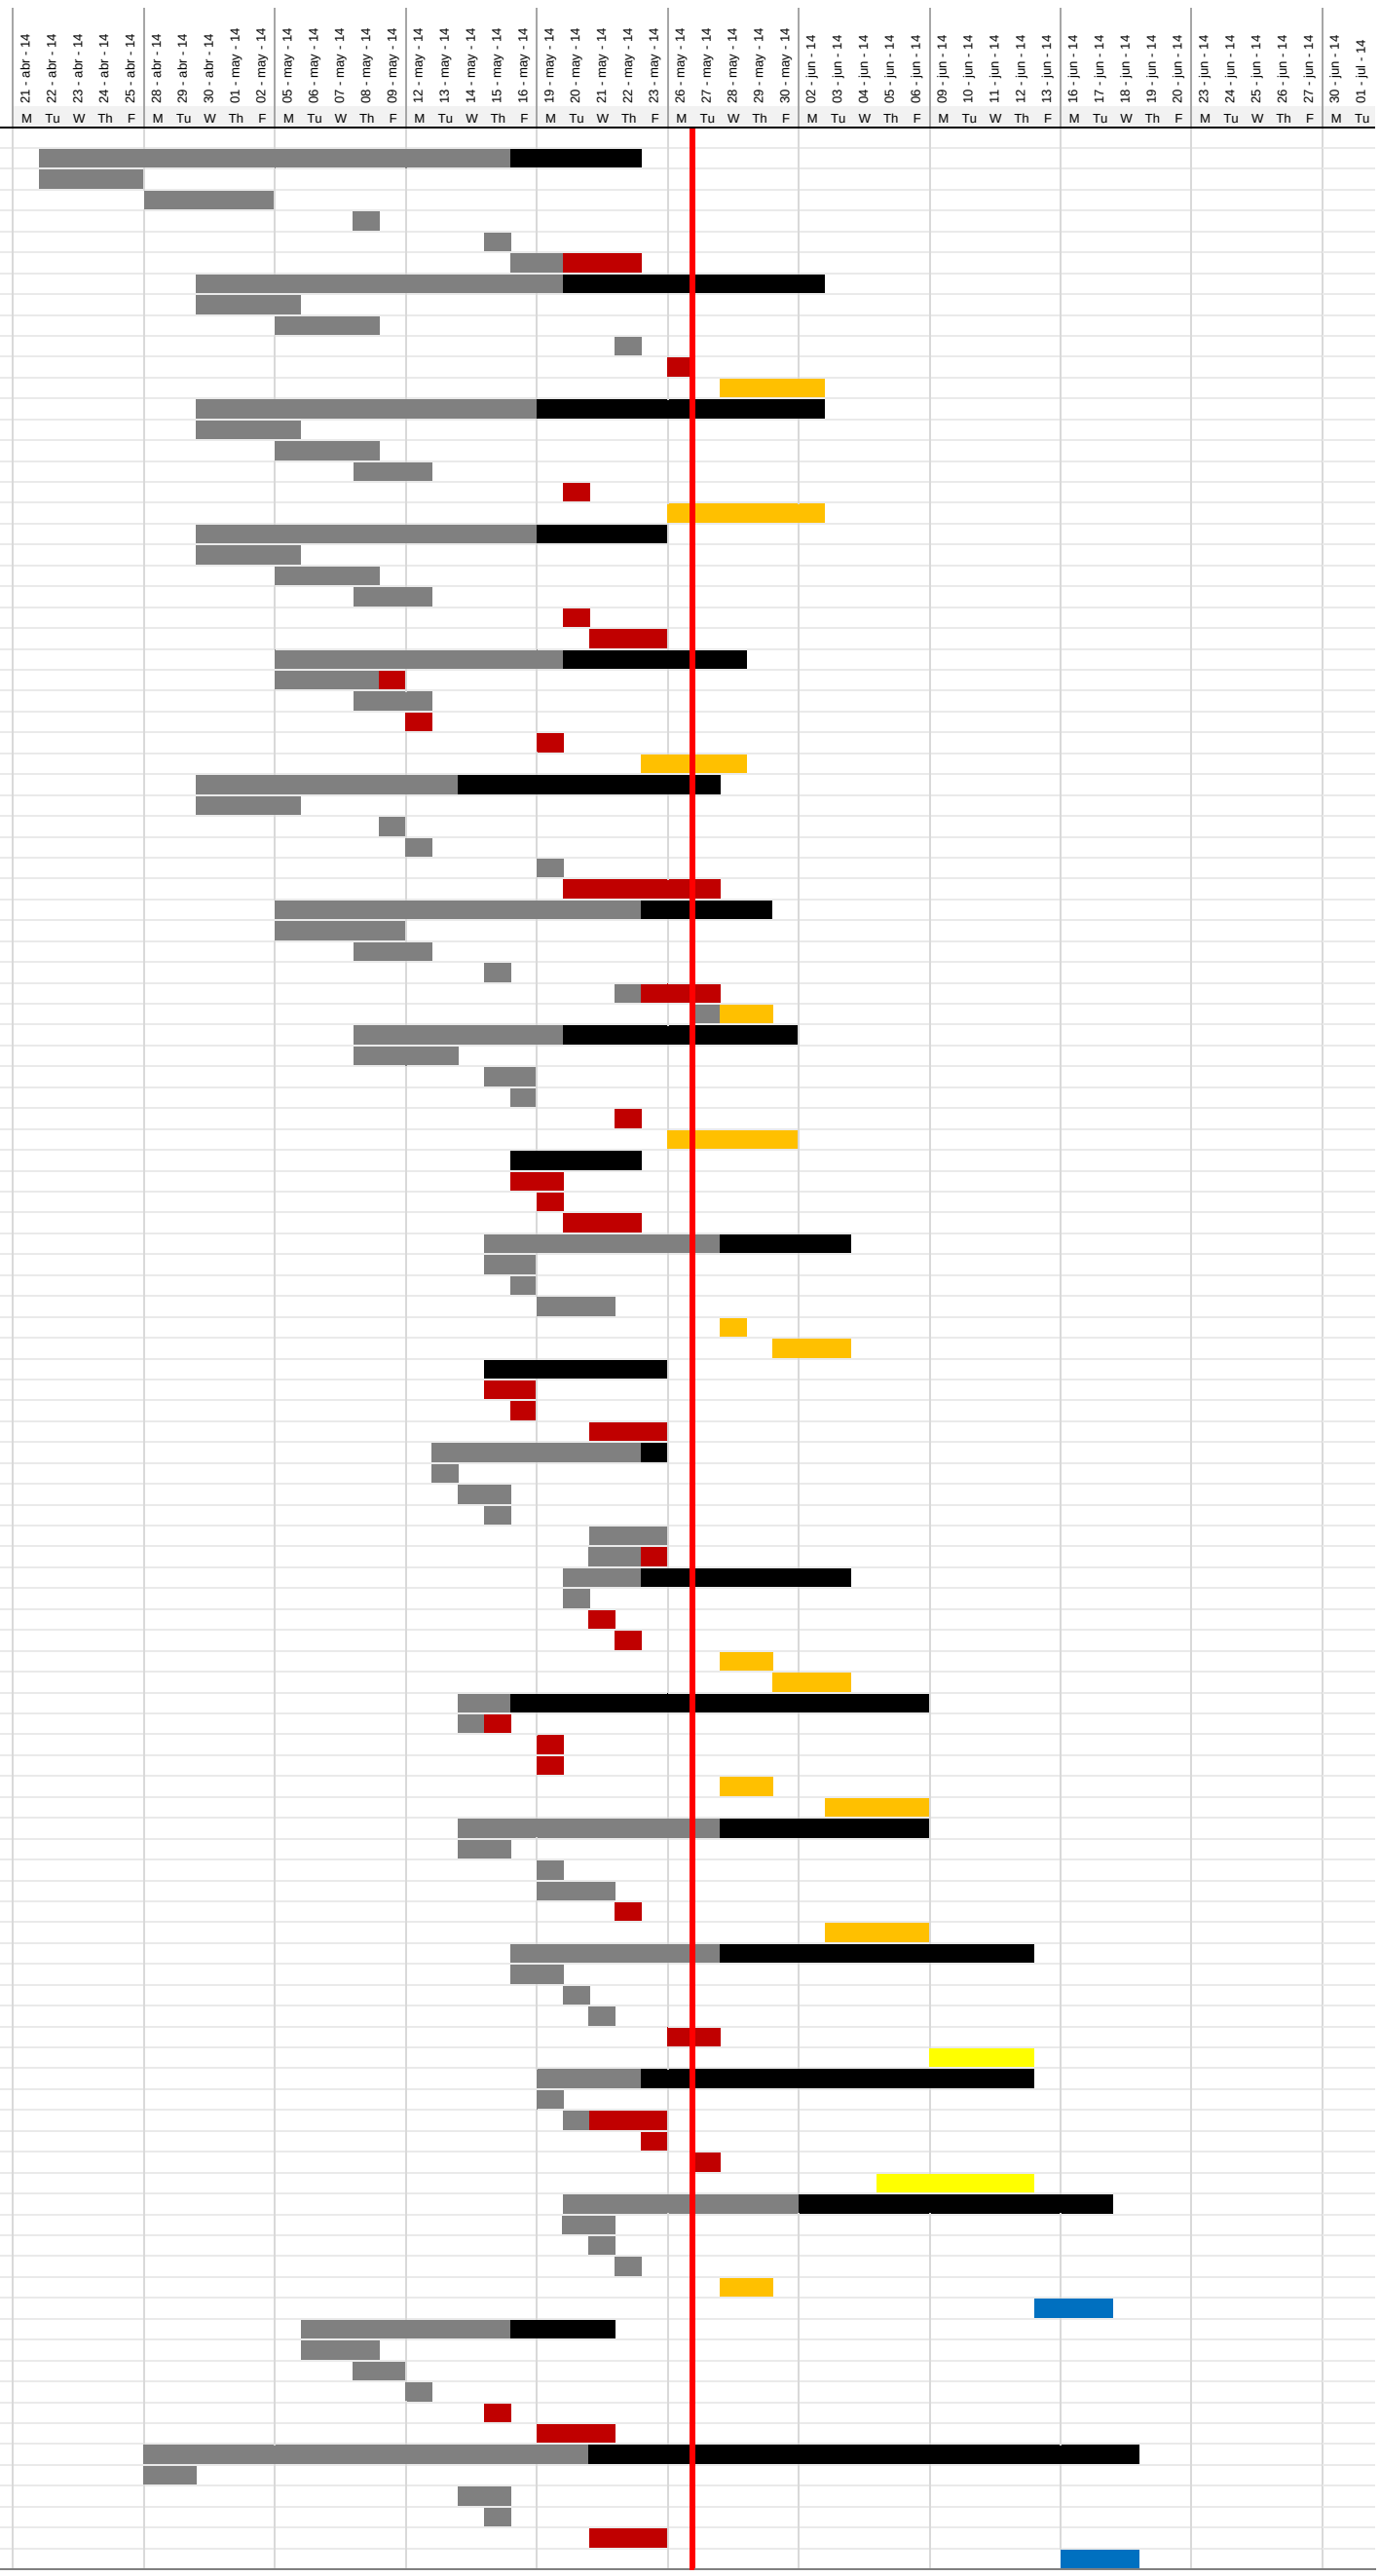

Tarea por detrás de planning o vencimento < 2 días naturales
Tarea c/vencimiento < 14 días naturales
Tarea c/vencimiento > 4 días naturales
Tarea ejecutada
